

건설관리본부 소관

I. 일 반 현 황

II. 2008 추진성과

III. 2009 업무여건과 중점방향

IV. 2009 주요업무 추진계획


1. 공사 부문
2. 시책 부문
3. 당면·현안사항

I. 일 반 현 황

1 주요기능

- 도로건설 및 공공건축 사업의 설계·시공·감독
- 공익사업을 위한 토지 등의 보상 및 취득
- 도로부속물 등 도로기능 유지시설 안전관리
- 도로·교량·차도육교·터널의 유지 및 보수
- 시민불편사항 즉시처리, 과적차량 예방홍보 및 단속 등
- 공사 및 자재 품질시험관리, 철도변정비사업 등 수탁사업 시행

2 조직 및 인력 / 2부, 7과, 19담당 - 정원 114명

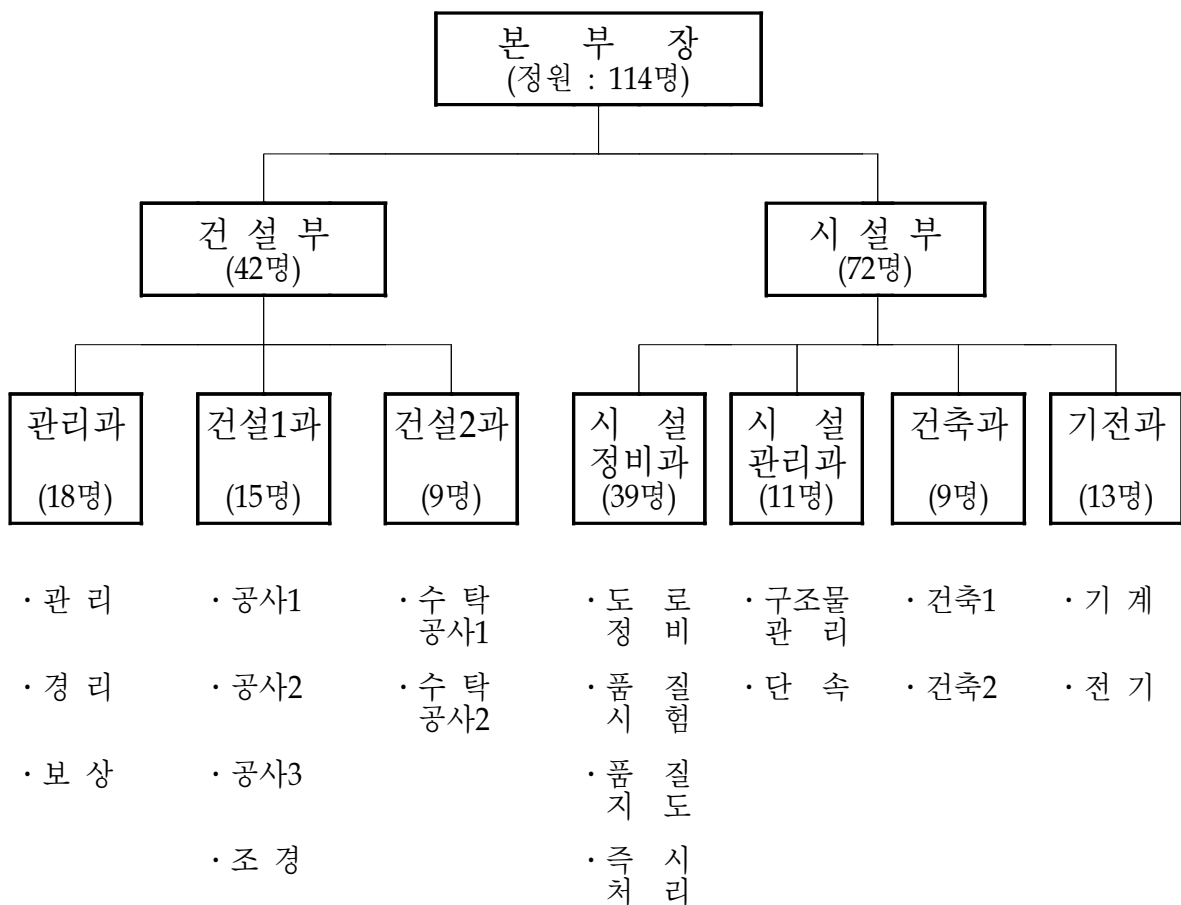

※ 정원외 인력 19명(도로보수원)

3 **2009년 예산현황**

[일반회계]

(단위 : 백만원)

○ 세 입	163
－ 맨홀정비 원인자 부담	110
－ 일반 부담금	46
－ 이자수입	7
○ 세 출	8,620 (100%)
－ 인 건 비	5,949 (69.0%)
－ 경 상 비	213 (2.5%)
－ 사 업 비	2,458 (28.5%)
· 도로관리직영사업장·품질시험실 신축	721
· 도로관리직영사업장·품질시험실 운영	123
· 도로 환경 정비	702
· 교량·터널 등 유지 관리	432
· 도로상 맨홀 정비	156
· 차량 및 기계장비 보수	241
· 재해 및 설해자재 구축	83

[재배정 사업비]

○ 일반·특별회계(도시교통, 공공건축 등)의 주요사업 : 43건 292,098백만원

Ⅱ. 2008 추진성과

튼튼하고 경제적이며 미적인 건설시공의 지향아래 가로변 녹지 조성 등 환경친화적이고 매력 있는 도시환경 조성에 전력

① 쾌적하고 편리한 도시기반시설 확충

○ 도로확장 및 개설공사 준공 개통 / 10건

- 신규개설 공사 / 4건
 - 컨벤션센터 주변도로(L=950m), 동물원 진입로 2단계(L=660m), 동부순환도로 3공구(L=2.62km), 사정~복수간 교량(L=150m)
- 확장 공사 / 5건
 - 옥천길(관암파출소~세천공원, L=2.7km), 진잠1길(L=780m), 구죽로(L=448m), 보훈공원 진입로(L=360m), 금산선(L=1.6km)
- 선형개량 / 1건
 - 대사로(L=579m)

② 아름답고 매력있는 공공건축물 건설

○ 공공건축물 준공 / 5건

- 신규 건립공사 / 2건
 - 청소년수련마을 생활관(지하1, 지상3층), 노은119 안전센터(지상3층) 반석역 환승주차장(지상3층, 247면)
- 개보수 공사 / 1건
 - 시립정신병원 시설물(지하1, 지상3층)
- 시설물 설치공사 / 1건
 - 인공암장(폭 28m, 높이 18m)

③ 안전한 도로·시설물 유지관리

○ 도로보수, 교량 보강 등 유지관리 공사 / 66건

- 도로 유지관리공사 / 1,761개소
 - 도로포장 정비(8개 노선 856a), 안내표지판 정비(304개소) 맨홀정비(380개소), 자전거도로 정비(95개소), 교통사고 잦은 곳 개선(16개소), 소규모 주민편익사업(12건) 버스전용차로 정비(신설 8.6km, 정비 946개소)
- 시설물 안전점검 용역 및 시설물 유지관리공사 / 70개소
 - 정밀점검 및 정밀안전진단(63개소), 교량 등 보수·보강(6개교) 서대전육교 보도개량(1개교)

Ⅲ. 2009 업무여건과 중점방향

업무여건

- 「전국체전」 「IAC 2009 대전대회」 등 대형행사 개최를 위한 도시 기반시설을 지속적으로 확충하고 시설물 안전관리를 강화해야 하는 해
- 시민들로부터 행정에 대한 주민참여 요구와 행정의 투명성, 직원의 청렴성에 대한 기대가 더 한층 요구되는 해
- 경제위기상황에 따른 지역건설경기 부양대책과 조기집행이 절실히 요구되는 해
- ▶ 100년 대계의 실용적이고 경제적인 시공과 창조도시 대전을 향한 美적 시공으로 행복한 대전의 결실을 거두어야 하는 해



중점방향

안전제일, 아름다운 창조도시의 패러다임으로 변화

- 전국체전관련 공사 마무리 및 대형공사의 차질없는 추진
 - － 한밭종합운동장 리모델링, 수영장 건립, 경부고속철도변 정비사업 등
- 공사 품질관리 및 도로 시설물 안전관리 강화
 - － 도로직영사업장, 품질시험실 확장이전 교량·터널 등 정밀점검 안전진단 실시 등
- 아름다움과 쾌적함을 겸비한 자연친화적인 Green City 조성
 - － 간선도로변 녹지형 중앙분리대 나무심기, DTV 한빛대교 건설 등
- 지역건설경기 활성화 및 조기집행 추진
 - － 공사 조기 발주(상반기중 93%), 지역업체 참여 확대 등

IV. 2009 주요업무 추진계획

1. 공사부문

- 가. 도로건설사업
- 나. 공공건축사업
- 다. 기타 시설유지관리사업

2. 시책부문

- 가. 공정하고 투명한 대민행정 실현
- 나. 지역건설경기 활성화 추진
- 다. 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
- 라. 시민편의 도로기능 유지관리
- 마. 품질관리 강화를 통한 부실시공 방지

3. 당면 · 현안사항

- 가. 경부고속철도변 정비
- 나. 전국체전 관련 경기장 확충
- 다. 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 라. 유등천 좌안도로 확장

1. 공사 부문

총사업비 : 47건 211,571백만원

가. 도로건설사업 21건 139,596백만원

1) '09 준공대상 사업 — 7건 5,100백만원

- 옥천길 확장
- 문화로 확장
- 신탄진 문화의거리 확장
- 종합유통단지 북부진입로(1공구)
- 사고위험지역 정비
- 도심 가로숲 조성
- 인라인 롤러장 건립


2) 장기계속 사업 — 14건 134,496백만원

- 경부고속철도변 정비
- 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 벌곡길 선형개량
- 동물원 진입도로(3단계) 확장
- 가오동길 확장
- 무릉교 개설
- 국지도 32호선 건설
- 학하지구 진입로 개설
- 동부선 연결도로 개설
- 유등천 좌안도로 건설
- 자양동~용운동간 도로확장
- 읍내가외동읍교산천(천선) 도로 확장
- 상서동 철도입체화 시설 설치
- 대덕밸리IC 경관광장 조성



<대덕테크노밸리 진입로 개설>

나. 공공건축사업 14건 56,509백만원

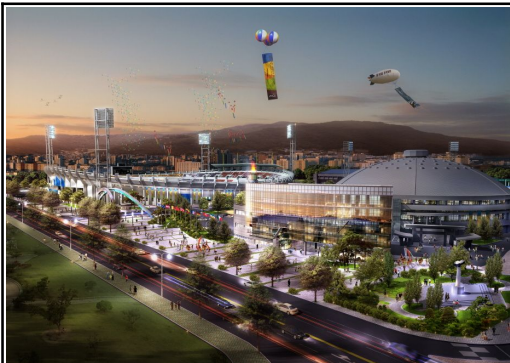

<한밭종합운동장 리모델링>

1) '09 준공대상 사업 — 7건 32,397백만원

- 한밭종합운동장 리모델링
- 전국체전 수영장 건립
- 무형문화재 전수회관 건립
- 대전여성가족문화회관 건립
- 문화119 안전센터 건립
- 도로관리 직영사업장 및
- 품질시험실 건립
- 웃다리농악 전수교육관 건립

2) 장기계속 사업 — 7건 24,112백만원

- 서부소방서 리모델링
- 근로자종합복지관 건립
- 교통안전체험교육센터 건립
- 제2시립 노인전문병원 건립
- 국민생활관 리모델링 공사
- 시 노인복지관 부속건물 재건립
- 장애인 근로사업장 건립

다. 기타 시설유지관리사업 12건 15,466백만원

1) 도로 유지관리 사업 — 7건 12,475백만원

- 도로포장, 시설물 및 안내표지판 정비 등

2) 교량·터널 유지관리 — 5건 2,991백만원

- 정밀점검 및 안전진단 용역, 교량 보수·보강 등

가. 도로건설 사업 / 총 21건 139,596백만원

1) '09 준공대상 사업 / 총 7건 5,100백만원

가) 옥천길 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 신흥동 제2치수교 ~ 마달령 시계
- 사 업 량 : L=8.0km B=35~50m
- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 54,300백만원(기투자 54,300/ 09투자 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2004. 5. 30 제1구간(제2치수교~판암파출소, L=1.8km) 준공
- ▶ 2008. 10. 제2구간(판암파출소~세천공원 입구, L=2.7km) 준공
- ▶ 2007. 5. 8 ~ 8. 7 제3구간(세천공원~시계, L=3.5km) 타당성 조사용역
- ▶ 2008. 7. 23 제3구간, 확장공사 기본 및 실시설계용역 완료
- ▶ 2008. 12. 현재 제3구간 보상협의 및 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

나) 문화로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 대사동 중앙교회 ~ 문화동 문화육교
- 사 업 량 : L=1.45km B=25→30m
- 사업기간 : 1998. 3 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 17,281백만원(기투자 15,181 / 09투자 2,100)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 1998. 3. 13 도시계획사업 실시계획인가
- ▶ 2007. 9. 20 충남기계공고~충남대병원구간(1.36km) 확장공사 완료
- ▶ 2008. 2. 29 충대병원 앞 구간 보상 완료
- ▶ 2008.12. 현재 조기집행 계획에 따라 계약체결 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 1 충대병원 앞 공사 계약 및 착공
- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

다) 신탄진 문화의거리 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 신탄진동(문화의 거리)
- 사업량 : L=98m, B=28m (4차로 → 6차로)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2009. 12
- 사업비 : 4,600백만원(기투자 1,800 / 09투자 2,500 / 이후 300)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. ~ 10. 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 10. 19 도시계획시설사업(도로) 실시계획 고시
- ▶ 2008. 4. ~ 12 보상협의 추진중
- ▶ 2008. 8. 4 지장물 철거공사 착공
- ▶ 2008. 12. 현재 조기집행 계획에 따라 계약체결 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1 공사 착공
- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

라) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구)건설

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 구암동 금성농장 ~ 대정동 종합유통단지
- 사업량 : L=4.5km, B=30m
- 사업기간 : 2002. 12 ~ 2009. 6
- 사업비 : 63,774백만원(기투자 63,274 / 09투자 500)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2002. 12. 30 공사 착공
- ▶ 2004. 5. 15 금성농장~복용동 개통(L=1.0km)
- ▶ 2005. 4. 4 유통단지~음지뜸 개통(L=0.6km)
- ▶ 2006. 12. 음지뜸~화산교간 중간층 포장 완료
- ▶ 2007. 9. 화산교~덕고개 시공
- ▶ 2007. 12. 31 본선 전구간 임시 개통(L=4.5km)
- ▶ 2008. 10. 호남고속도로 우회개도(L=900m) 시공
- ▶ 2008. 12. 호남고속도로 횡단교량 시공중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 4. 30 호남고속도로 통과교량 및 복용암거 시공
- ▶ 2009. 6. 30 공사 준공(예정)

마) 사고위험지역(진잠네거리외1개소)정비

○ 공사개요

- 위 치 : 서구 진잠네거리 외 1개소
- 사 업 량 : 노면정비 A=150a, 좌회전차로 확보 L=174m
- 사업기간 : 2008. 12 ~ 2009. 4
- 사 업 비 : 472백만원(기투자 472 / 09투자 -)

○ 추진상황

- ▶ 2008. 12. 17 공사 계약 / 신아건설(주)
- ▶ 2008. 12. 18 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 4. 21 공사 준공 예정

바) 도심 가로숲 조성

○ 공사개요

- 위 치 : 금산길 등 8개노선
- 사 업 량 : 중앙분리대 녹지화단조성(3,811m) 및
지하차도상부 및 교통섬 화단조성(1,502m²)
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2009. 4
- 사 업 비 : 2,520백만원(기투자 2,520 / 09투자 -)

○ 추진상황

- ▶ 2008. 6 녹지형중앙분리대 노선확정에 따른 설계완료
- ▶ 2008. 9 공사 착공
- ▶ 2009. 4 공사 준공(토목공정은 '08. 12. 20일까지 완료)

사) 인라인 롤러장 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 노은동 529번지(노은 유수지내)
- 사 업 량 : 200m 뱅크트랙, 조정 및 전기시설, 기타 부대시설
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2009. 6
- 사 업 비 : 2,000백만원(기투자 2,000 / 09투자 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 3. ~ 6. 기본 및 실시설계 추진
- ▶ 2008. 8. 6 공사 착공
- ▶ 2008. 9. 5 ~ 10. 17 지하수 유출에 따른 처리 방안 강구
- ▶ 2008. 10. 기존 구조물 철거 및 폐기물 반출
- ▶ 2008. 11. 본부석, 막구조, 맹암거 설치 및 골재 포설 U형측구, L형옹벽 설치

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1. ~ 2월 동절기 공사 일시 정지
- ▶ 2009. 3. 진입도로 포장, 트랙부분 콘크리트 타설
- ▶ 2009. 4. 트랙부분 포장
- ▶ 2009. 5. 공인절차 이행 및 공사 준공

2) 장기계속사업 / 총 14건 134,496백만원

가) 별곡길 선형개량

○ 사업개요

- 위 치 : 서구 기성동, 매노동, 평촌동 일원
- 사 업 량 : L=3.8km, B=25m
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 16,700백만원(기투자 983 / 09투자 4,230 / 이후 11,487)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 11. 3 1공구(기성동) 실시설계 용역 착수
- ▶ 2008. 12. 23 2공구(매노동), 3공구(평촌동) 실시설계 용역 계약

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 3 1공구(기성동) 실시설계 용역 준공
- ▶ 2009. 4 ~ 2009. 12 1공구(기성동) 보상 및 공사 추진
- ▶ 2009. 6 2공구(매노동), 3공구(평촌동) 실시설계 용역 준공
- ▶ 2009. 7 ~ 2011. 7 2공구(매노동) 보상 및 공사 추진
- ▶ 2011. 1 ~ 2011. 12 3공구(평촌동) 보상 및 공사 추진

나) 동물원 진입도로 확장(3단계)

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 사정동 일원
- 사 업 량 : L=1.4km, B=7→25m
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2011. 11
- 사 업 비 : 14,700백만원(기투자 4,950 / 09투자 5,000 / 이후 4,750)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 1998 ~ 2002 1단계구간(상당마을~동물원, 1.4km)
- ▶ 2008. 10. 18 2단계구간(탐골부락 ~ 한밭도서관길, 660m) 준공
- ▶ 2006. 10. 3단계구간(사정동 일원, 1.4km) 공사 발주
- ▶ 2008. 11.27 3단계 토목공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2011. 11 공사 준공(예정)

다) 가오동길 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 천동(홍익APT) ~ 동구 대성동(대성삼거리)
- 사 업 량 : L=2.2km, B=15→25m
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 29,200백만원(기투자 8,652 / 09투자 6,500/ 이후 14,048)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 12. 4 실시설계용역 완료
- ▶ 2007. 12. 7 보상계획 공고 및 통지
- ▶ 2008. 12.월 현재 일부 지장물 철거공사 완료, 보상협의중(65%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 1 공사 착공
- ▶ 2011. 12 공사 준공(예정)

라) 무릉교 개설

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 중촌동 ~ 대덕구 오정동 (오정오거리)/대전천
- 사 업 량 : L=183m, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 2008. 4 ~ 2010. 3
- 사 업 비 : 9,970백만원(기투자 187 / 09투자 4,500 / 이후 5,283)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 5. 중기지방재정계획 반영
- ▶ 2008. 7 21 실시설계 용역 착수
- ▶ 2008. 9 26 실시설계 용역 중간보고회/교량공법선정
- ▶ 2008. 12 22 경관위원회 심의

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2 공사 착공
- ▶ 2010. 3 공사 준공(예정)

마) 국지도 32호(석봉4가~충북도계간) 건설

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 석봉동(석봉4가) ~ 충북도계(용정초교 옆)
- 사 업 량 : L=1.303km, B=20.5~35.0m
- 사업기간 : 2009. 01 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 45,000백만원(기투자 8,999 / 09투자 6,945 / 이후 29,056)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2006. 4. 17 국비지원 건의(국토해양부)
- ▶ 2006. 6. 26 국지도 5개년(2006~2010)계획 통보(국토해양부→대전시)
- ▶ 2007. 8. 21 실시설계용역 착수 / '08.11.20 : 용역 준공
- ▶ 2008. 8. 8 도로사업노선계획(안) 공람 및 주민설명회 개최공고
- ▶ 2008. 8. 12 주민설명회 개최(신탄진동사무소)
- ▶ 2008. 9. 11 도시관리계획 결정(변경) 입안에 따른 공람공고
- ▶ 2008. 12. 도로구역결정고시 행정절차 이행중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2 공사 착공
- ▶ 2011. 12. 공사 준공(예정)

바) 학하지구 진입로 도로개설

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 복용동
- 사 업 량 : L=280m, B=35m
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 15,830백만원(기투자 - / 09투자 5,000 / 이후 10,830)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 9. 3 신규사업 추진계획 보고
- ▶ 2008. 9 2009 본예산 사업비 확보 요청(건설도로과)
- ▶ 2008. 10. 지방재정 투융자 심사 및 중기재정계획 반영

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2. 도로구역 결정 고시
- ▶ 2009. 2. ~ 12. 보상 추진
- ▶ 2010. 1 공사 착공
- ▶ 2010. 12 공사 준공

사) 동부선 연결도로 개설

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 소재동 계족로 ~ 자양로
- 사 업 량 : L=1.169km, B=30m (도로개설 주체 : 주택공사 716m, 대전시 453m)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 21,700백만원(기투자 12,500 / 09투자 5,000 / 이후 4,200)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. 3 ~ 2008. 1. 7 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 10. 19 도시계획시설사업(도로) 실시계획 고시
- ▶ 2008. 12월 현재 보상협의중(82%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 3 공사 착공
- ▶ 2011. 12 공사 준공(예정)

아) 자양동~용운동간 도로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 자양동(자양로~우송대학교)
- 사업량 : L=660m, B=12→25m
- 사업기간 : 2003. 01 ~ 2010. 12
- 사업비 : 17,266백만원(기투자 13,134 / 09투자 4,125 / 이후 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2003. 11. 21 도시계획시설사업 실시계획 고시
- ▶ 2006. 11. 9 도시계획시설사업 변경 고시
- ▶ 2006 ~ 2007 일부 지장물 철거공사
- ▶ 2008. 10. 토지 및 지장물 보상 협의중
- ▶ 2008. 12. 29 조기집행 계획에 따라 계약체결 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1. 공사 착공
- ▶ 2010. 12. 공사 준공(예정)

자) 읍내3가~와동육교(신탄진선) 도로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 읍내3가 ~ 와동육교
- 사업량 : L=4.5km, B=35m
- 사업기간 : 2003. 12 ~ 2012. 12
- 사업비 : 49,000백만원(기투자 4,983 / 09투자 5,000 / 이후 39,017)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2003. 12. 29 ~ 2005. 7 19 실시설계용역 추진
- ▶ 2004. 12. 3 도시계획시설사업 실시계획고시
- ▶ 2005. 11. 11 도시계획시설사업 실시계획변경 고시
- ▶ 2008. 12월 현재 토지 및 지장물 보상협의 추진(감정평가 및 보상협의중)
※ 조기집행 계획에 따라 계약체결 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1 건물철거 및 폐기물처리용역 착수
- ▶ 2012. 12 공사 준공(예정)

차) 상서동 철도입체화 시설 설치

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 상서동(산막~철도차량정비창)
- 사 업 량 : L=920m, B=25m
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 38,000백만원(기투자 2,800 / 09투자 - / 이후 35,200)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2004. 12 ~ 2007. 6. 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 7. 20 도시계획시설사업 실시계획 고시
- ▶ 2008. 12. 현재 토지 및 지장물 보상협의 추진중(68%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1 토지 및 지장물 보상협의 추진
- ▶ 2011. 12 공사 준공(예정)

카) 대덕밸리IC 경관광장 조성

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 화암동 200번지 일원
- 사 업 량 : 조성면적 16,790m²
- 사업기간 : 2005. 2 ~ 2010. 6
- 사 업 비 : 7,824백만원(기투자 5,623 / 09투자 1,601 / 이후 600)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2003. 8. 도시계획시설 결정
- ▶ 2004. 4. ~ 2005. 2 기본계획 및 실시설계 추진
- ▶ 2006. 12 보상 완료
- ▶ 2008. 3 사업계획 변경 완료
- ▶ 2008. 6 공사 착공
- ▶ 2008. 12 토공(사토) 및 하수관 부설 완료

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 6 공사 준공(예정)

타) 경부고속철도변 정비사업, 대덕테크노밸리 진입로 개설,
유등천 좌안도로 건설 / 3. 당면·현안사항에서 보고

나. 공공건축 사업 / 총 14건 56,509백만원

1) '09. 준공대상사업

가) 무형문화재 전수회관 건립 / 관광문화재과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 대덕구 송촌동 463번지(동춘당 근린공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상1층, 연면적 1,620㎡
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 1
- 사 업 비 : 3,900백만원 (기투자 3,900)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 12. : 공사 착공
- ▶ 2008. 12월 현재 : 전시실 제작설치

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1. 공사 준공(예정)

나) 대전여성가족문화회관 건립 / 여성가족청소년과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 동구 대성동 133번지(가오택지개발지구 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 4,143㎡
- 사업기간 : 2004. 4 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 10,020백만원 (기투자 6,323 / '09년 3,697)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 9. : 공사 착공
- ▶ 2008. 12월 현재 : 지하층 골조공사 완료

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 11. : 공사 준공(예정)

다) 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 서구 정림동 8-1번지 일원(남부소방서 인근)
- 규 모 : 지상2층, 연면적 1,413m²
- 사업기간 : 2008. 8 ~ 2009. 7
- 사 업 비 : 3,545백만원 (기투자 2,824 / '09투자 721)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 8. 22. : 공사 착공
- ▶ 2008. 12월 현재 : 관리동 옥탑, 지붕난간 형틀 손보기, 차고동 페아스콘패드 형틀 및 철근배근

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 7. 18 : 공사 준공(예정)

라) 웃다리농악 전수교육관 건립 / 관광문화재과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 유성구 아리랑길 168(하수종말처리장 내)
- 규 모 : 부지면적 404,334m², 증축면적 398.66m²
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 6
- 사 업 비 : 620백만원 (기투자 620)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 7 ~ 11월 : 설계용역 추진
- ▶ 2008. 12월 : 입찰공고

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 01. : 공사 착공
- ▶ 2009. 06. : 공사 준공(예정)

마) 문화 119 안전센터 건립 / 소방본부 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 중구 문화동 1-254번지
- 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 750m²
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 1,320백만원 (기투자 49)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 12 현재 : 실시설계용역 추진 중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 03. : 공사계약 및 착공
- ▶ 2009. 11. : 공사 준공(예정)

바) 전국체전관련 경기장 확충 / 당면·현안사항에서 보고

2) 장기계속사업

가) 서부소방서 리모델링 / 소방본부 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 서구 둔산동 1304번지(근로자종합복지관)
- 규 모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 5,418m²(기존 3,304m², 증축 2,114m²)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2010.
- 사 업 비 : 4,747백만원 (기투자 4,747)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. : 서부소방서이전 변경계획 방침결정
- ▶ 2008. 2. 25 : 서부소방서이전 시기 조정

○ 향후 추진계획

- ▶ 대덕테크노밸리 근로자종합복지회관 준공('09.10) 이후 사업 추진

나) 근로자종합복지관 건립 / 경제정책과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 관평동 767번지(대덕테크노밸리 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 4,764m²
- 사업기간 : 2007. 9 ~ 2010. 02
- 사 업 비 : 9,605백만원 (기투자 3,388 / '09투자 6,217)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 2. ~ 8월 : 설계용역 추진
- ▶ 2008. 12. 11. : 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 02. : 공사 준공(예정)

다)交通安全체험 교육센터 건립 / 교통정책과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 유성구 도룡동 3-1번지 (엑스포과학공원 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 11,511m²
- 다목적교육관, 각종체험시설, 전시시설, 연구시설
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2010.
- 사 업 비 : 34,299백만원(기투자 27,879 / '09투자 6,420)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2006. 4. : 공사 착공
- ▶ 2008. 12. 17. : 4차분 공사 준공

○ 향후 추진계획

- ▶ 잔여사업비 확보시 5차분 공사추진

※ 2009년도 마무리 공사비 90억원(공사비 65억원, ES 및 관리비 25억원)
확보 불투명 / 경찰청

라) 제2시립 노인전문병원 건립 / 보건위생과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 동구 하소동 425-13번지 외 3필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 4,290m²
- 사업기간 : 2007. 10 ~ 2010. 03
- 사 업 비 : 6,354백만원 (기투자 3,380)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 12. 26 : 공사 및 감리 계약

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 12. : 공사 착공
- ▶ 2010. 03. : 공사 준공(예정)

마) 국민생활관 리모델링공사 / 체육지원과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 서구 갈마동 820-1번지(갈마공원내)
- 규 모 : 지하2층/지상3층, 연면적 6,390.32m²
- 사업기간 : 2008. 12 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 3,306백만원 (기투자 84)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 12 현재 : 실시설계용역 추진 중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 03. : 설계용역 완료
- ▶ 2009. 05. : 공사계약 및 착공

바) 시 노인복지관 부속건물 재건립 / 노인복지과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 중구 대흥동 311-1번지의 5필지
- 규 모 : 지상2층, 연면적 780m²
- 사업기간 : 2008. 10 ~ 2010. 03
- 사 업 비 : 1,632백만원 (기투자 46)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 12 현재 : 기본설계용역 추진 중(설계용역착수 : '08. 12. 26)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 05. : 설계용역 완료
- ▶ 2009. 06. : 공사계약 및 착공

사) 장애인 근로사업장 건립 / 장애인복지과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 대덕구 문평동 77-5번지
- 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 3,724.4m²/2개동
- 사업기간 : 2008. 12 ~ 2010. 07
- 사 업 비 : 6,680백만원 (기투자 2,987)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 12 : 실시설계용역 입찰공고

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 05. : 설계용역 완료
- ▶ 2009. 07. : 공사계약 및 착공

다. 기타 시설 유지관리 사업 / 7개분야 12,475백만원

가) 시관내 도로포장 정비 / 건설도로과 재배정

- | | |
|---------------------|---|
| 목 적
(효과) | ○ 전국체전, IAC 행사대비 쾌적하고 안전한 도로환경 제공
○ 균열, 소성변형된 도로의 평탄성을 유지하는 등 포장면 정비 |
|---------------------|---|

○ 사업개요

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • 위 치 : 옥계로(석교초교~옥계교) 등 3개노선 | |
| • 규 모 : L=3,100m, A=600a | |
| • 사업기간 : 2009(연중) | • 사 업 비 : 1,200백만원 |

○ 2008 추진실적

- ▶ 대덕대로 등 8개 노선 L=4,958m A=856a / 1,550백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ '08. 12 : 실시설계 및 집행품의 / 조기발주
- ▶ '09. 1 : 관련기관 협의 및 계약심사 / 공사착공
- ▶ '09. 6 : 공사준공 예정

나) 도로안내표지판 교체 / 건설도로과 재배정사업

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 목 적
(효과) | 도로안내표지판 정비로 이정편의 제공 |
|---------------------|---------------------|

○ 사업개요

- | | |
|--|------------------|
| • 위 치 : 보문로 | |
| • 규 모 : 도로안내표지판 교체 29개소 | |
| • 내 용 : 규격확대(30%) / 도로안내표지규칙개정('97.1.20) | |
| • 사업기간 : 2009(연중) | • 사 업 비 : 300백만원 |

○ 2008 추진실적

- ▶ 교체(자양로) 10개소, 지주정비 및 문안수정(시 관내) 295개소 / 200백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ '09. 1 : 현지조사 및 실시설계
- ▶ '09. 2 : 관련기관 협의 및 계약심사 / 집행품의(조기발주)
- ▶ '09. 6 : 공사 준공 예정

다) 도로상 맨홀정비

목 적 (효과)	도로상 불량맨홀을 정비하여 안전사고 사전방지 및 쾌적한 도로환경 조성
---------------------------	--

○ 사업개요

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 위 치 : 시 관내• 규 모 : 상수도, 하수도, 한전, 통신맨홀 정비(197개소)• 사업기간 : 2009(연중)• 사 업 비 : 155백만원 <p>※ 도로관리청과 맨홀관리기관간 협정에 의거 매년 실시</p> |
|---|

○ 2008 추진실적

- ▶ 시 관내 상·하수도·전기·통신 320개소 정비 / 300백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ '09. 2 : 맨홀정비대상 현지조사 및 사업물량 확정
- ▶ '09. 3 : 집행품의 및 공사착공
- ▶ '09. 4 ~ 5 : 기관별 부담금 부과 및 징수 / 4개 기관
- ▶ '09. 7 : 공사 준공 예정

라) 목척교 주변 도로정비 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)	생태하천 복원계획에 따라 목척교 상하주변에 대한 종합적인 정비를 통한 원도심 활성화 추진
---------------------------	---

○ 사업개요

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 위 치 : 목척교 및 중교로 일원• 규 모 : 보차도 정비 및 천변녹화 2.15km• 사업기간 : 2009 ~ 2010• 사 업 비 : 7,507백만원 <p>※ 대전천 생태복원에 따른 목척교 주변 종합정비계획에 의거 추진</p> |
|--|

○ 2009 추진계획

- ▶ '09. 1 : 현지조사 및 과업지시서, 실시설계서 작성
- ▶ '09. 2 : 실시설계 용역 집행품의
- ▶ '09. 4 : 사업시행 방향 등 관련기관 협의 / 경찰청, 구청 등
- ▶ '09. 5 : 도시경관 및 디자인 심의
- ▶ '09. 6 ~ 7 : 용역설명회 및 계약심사, 실시설계 성과물 납품
- ▶ '09. 8 ~ '10. 12 : 공사추진

마) 자전거 기반시설 정비 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)	주요 간선도로내 자전거 기반시설 확충을 통한 자전거이용 활성화 도모 및 교통혼잡 해소
---------------------------	---

○ 사업개요

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 위 치 : 시 관내• 규 모 : 단절구간 및 미개설 구간 6개소
전용차로 설치 4개 노선• 사업기간 : 2009(연중) | <ul style="list-style-type: none">• 사 업 비 : 1,850백만원 |
|--|--|

○ 2009 추진계획

- ▶ '09. 1 : 추진계획 방침 및 실시설계서 작성
- ▶ '09. 2 : 실시설계 용역 집행품의
- ▶ '09. 3 ~ 6 : 차선조정 등 사업시행 방향 협의 / 경찰청, 구청 등
- ▶ '09. 5 ~ 6 : 도시경관 심의 및 용역설명회, 계약심사 / 용역 완료
- ▶ '09. 7 ~ 12 : 공사추진

바) 교통사고 잦은 곳 개선사업 / 교통정책과 재배정

목 적 (효과)	불합리한 도로구조 개선으로 교통사고 예방
---------------------------	------------------------

○ 사업개요

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 대 상 : 동구 성남네거리 등 8개소• 내 용 : 가각정비, 차선조정, 교통섬, 안전시설 설치 등• 사업기간 : 2009(연중)• 예 산 액 : 940백만원(국비 50%) |
|--|

○ 2008 추진실적

- ▶ 갑천대교 네거리 등16개소 / 894백만원(국비 50%)

○ 2009 추진계획

- ▶ '09. 1. ~ 2 : 현지조사 및 기본설계
- ▶ '09. 3 ~ 4 : 관련기관 협의(경찰청, 교통안전공단, 구청 등) 및 실시설계
- ▶ '09. 5 : 집행품의
- ▶ '09. 9 : 공사준공 예정

사) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수

목 적 (효과)

안내표지판 등 도로시설물을 적기에 정비하여 이용자 편의 제공

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 500백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 도로포장면(함몰, 소성변형, 소파 등), 도로시설물(반사경, 시선유도봉) 및 도로안내표지판(지주도색, 문정수정)정비 등 연중 공사 추진

2) 교량·터널 유지·관리 / 5건 2,991백만원

가) 정밀점검 용역 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)

정밀점검을 통한 교량 등의 기능 및 안전을 유지하여 공중의 안전 확보

○ 사업개요

- 원촌교 등 48개소
· 교량30, 복개구조물 2, 터널 2, 지하차도 14
- 내 용 : 점검주기 / A등급(3년), B·C등급(2년), D·E등급(1년)
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 5.
- 예 산 액 : 600백만원

○ 2008 추진실적

- ▶ 시특법대상시설 29개소, 특정관리대상시설 24개소 / 579백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1월중 착수
- ▶ 5월중 용역 완료

나) 정밀안전진단 용역 / 방재과 재배정

목 적 (효과)

정밀안전진단을 통한 특정관리대상시설물의 기능 및 안전 유지

○ 사업개요

- 대 상 : 가양교 등 3개교 (특정관리대상시설)
- 내 용 : 정밀안전진단 / 정밀점검용역결과 안전진단 필요시설
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 5.
- 예 산 액 : 91백만원

○ 2008 추진실적

- ▶ 시특법대상시설 10개소 / 856백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1월중 착수
- ▶ 5월중 용역 완료

다) 교량 보수·보강공사 / 건설도로과, 방재과 재배정

목 적 (효과)

구조적 결함 요인을 사전에 보수·보강함으로써 시민의 안전과 재산보호

○ 사업개요

- 대 상 : 도마교 등 4개교
 - 시특법대상시설 (1) : 교량 1개교(도마교) / 600백만원
 - 특정관리대상시설(3) : 교량 3개교(도마육교,신대과도교,매봉교) / 700백만원
- 내 용 : 시설물의 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 6.
- 사 업 비 : 1,300백만원(건설도로과 600, 방재과 700)

○ 2008 추진실적

- ▶ 홍도육교 등 6개소 보수·보강 / 1,780백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1월중 공사 착공
- ▶ 6월중 공사 준공

라) 복개구조물 보수·보강 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)	구조적 결함 요인을 사전에 보수·보강하여 시민의 안전과 재산보호
---------------------	-------------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 남선공원 입구복개구조물(가장로내) 1개소
- 내 용 : 시설물의 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 6.
- 사 업 비 : 700백만원(건설도로과)

○ 2009 추진계획

- ▶ 1월중 공사 착공
- ▶ 6월중 공사 준공

마) 교량부속물 등 보수

목 적 (효과)	교량 부속물에 대한 소규모정비를 적기 시행, 이용자 편의 제공
---------------------	------------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 155개 관리시설
- 내 용 : 교면, 이음장치, 난간 등 교량 등의 부속물 및 구조물 긴급보수
- 사업기간 : 2009(연중)
- 예 산 액 : 300백만원

○ 2008 추진실적

- ▶ 중촌고가교 등 35개소 / 274백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 교량·터널 등 시설물의 노후·파손부분 지속보수 추진

2. 시책부문

- 가. 공정하고 투명한 대민행정 실현
- 나. 지역건설경기 활성화 추진
- 다. 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
- 라. 시민편의 도로기능 유지관리
- 마. 품질관리 강화를 통한 부실시공 방지

가. 공정하고 투명한 대민행정 실현

◇ 직원 「윤리실천강령」 생활화 및 계약의 투명화

- 업무추진과 사생활에 있어 직원들의 행동기준 마련('07. 12. 14 제정)

- ① 업무에 임하는 자세 ② 직장생활의 태도
③ 사생활 규범 ④ 청렴 및 품위 유지 ⑤ 부단한 자기개발 등

－ 홈페이지 활용 홍보, 전직원 지속적인 교육을 통한 생활화 실천

- 소규모 계약 공개수의견적 제출 및 전자계약제 (조달청 G2b 이용) 시행

－ 건설행정의 투명·청렴성 지속 유지로 시민들의 객관적 신뢰 확보

◇ 신속하고 공정한 보상업무 추진

- 보상민원 관련 앙케트 실시(연2회)로 시민편의 서비스 제고
- 보상합동 조사반(소유자, 통·반장, 공사감독자) 운영으로 신속한 보상 및 민원해소
- 보상절차 안내 매뉴얼 제작·배부(1,000부)로 관계인 이해 증진

나. 지역건설경기 활성화 추진

◇ 지역업체 참여 및 공동도급 확대

- 낙찰업체 및 공사 참여업체와 유기적 관계 유지 / MOU체결
－ 간담회 개최 등으로 지역상품 구매 및 지역업체 하도급 참여 적극 권유
- 조달계약 의뢰시 공동도급 명시 등 지역업체 보호
- 입찰공고 시 지역제한 및 공동 도급사항 명기 / 일반 70억, 전문6억 미만

◇ 지역인력수급·물품구매 적극 노력

- 우리 본부에서 추진하는 모든 공사현장에 지역인력 수급 노력
- 공사 자재·장비 지역물품 사용 권장 / 공사계약시 조건 제시 등
- 사업장별 지역인력·물품사용 관리카드 작성 관리

다. 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

◇ 사업계획 단계부터 도시의 미(美), 친환경성 검토

- 사업추진 단계마다 도시 디자인, 환경성 검토 의무화
- 주·야 아름다운 도시환경 조성을 위해 야간경관 미적 검토
 - － 도로의 가로등(디자인, 불빛 등), 건축·시설물의 야간 조명시설 등
 - － 에너지 절감을 고려한 신·재생에너지 도입 적극 검토
- 친환경 보도블럭 시공 등 환경과 아름다움을 동시 구현

◇ 도로변 녹화사업 적극 추진

- 주요 간선도로 주변에 녹지대 조성
 - － 중앙분리대, 교통섬, 안전지대 녹지형(나무, 초화류 식재)으로 조성
- 횡단보도변 대목식재, 도로개설 여유공간(잔여지)에 쌈지공원 조성
- 공공사업지구내 수목 무상 기부제 시행
 - － 손실보상 완료 후 폐기되는 수목을 비영리사업에 무상기부 유도

라. 시민편의 도로기능 유지관리

◇ 시민불편 최소화를 위한 공사 시행

- 자재 과다반입 적치로 인한 도로 점용 지양(최소 물량만 반입)
- 차선통제가 수반되는 주요간선도로 공사 야간 시행(21:00~06:00)
 - － 주간공사 필요시 공휴일 및 출·퇴근시간을 피해 공사 시행
- 공사 실시설계 단계부터 교통저해 최소화를 위한 저감 공법 검토
- 임시차로 개설 등 대책 마련 후 공사 시행

◇ 공사현장 관리 및 홍보 강화

- 공사현장 수시 순찰 품질관리 현장기동반 운영 및 시민불편사항 즉시처리
- 본부 홈페이지, 교통방송, 신문 등 다중홍보매체 활용 공사장 홍보
- 공사장 야간조명 조도강화 및 안내점멸등 설치

마. 품질관리 강화를 통한 부실시공 방지

◇ 품질시험실 확충

- 품질시험실 신축(공정 12%)

신축 개요	· 위 치 : 서구 정림동 8-1 도로관리 직영사업장 내 · 면 적 : 462㎡, 공사기간 : '08. 8 ~ '09. 7 · 사업비 : 3,541백만원
----------	---


- 품질시험실 이전 : 2009. 하반기중

◇ 신뢰도 향상을 위한 시험장비 현대화

- 시험실 이전과 연계하여 시험장비 노후화에 따른 기능저하 시험장비 교체
— 총 38종 53기 중, 건조기 등 13기 교체 구입 / 소요예산 133백만원

◇ 시험종목 확대로 대외신뢰도 향상

- 국·공립 품질시험 대행기관 성격의 시험종목 단계적 확대



- 소요예산 : 1차(2009년) 열전도율 측정기 등 4기 120백만원
2차(2010년 이후) 외압강도 시험기 등 13기 212백만원



< 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 조감도 >

3. 당면 · 현안사항

- 경부고속철도변 정비
- 전국체전 관련 경기장 확충
- 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 유등천 좌안도로 확장

경부고속철도변 정비

- 동서 교통흐름 및 생활환경 개선으로 동서 균형발전 도모
- 지역업체 참여기회 확대를 통한 지역경기 활성화

□ 사업개요

- 구 간 : 대덕구 오정동 ~ 동구 판암I.C간(연장 6.7km)
- 사업량 : 3개분야 19건
 - 입체교차시설 개량 및 신설 : 17개소
 - 측면도로 개설 : 7.68km
 - 복합활용공간(녹지) : 5.83km
- 사업비 : 4,997억원(전액국비) / 공사비 2,730억원, 보상비 2,267억원
- 공사기간 : 2008 ~ 2014년

□ 추진상황

- 철도정비사업 대전시 수탁시행 협약체결 ('07.12.11)
 - | | |
|----------|--|
| 수탁
범위 | 경부고속철도건설 본선사업과 교차되는 구간을 제외한 모든 철도변
정비사업(수탁사업비 : 1,800억원 / '08년 110억, '09년 371억) |
|----------|--|
- 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역 추진 / 13개공구 분할 발주
- 한남고가차도 건설공사 및 전면책임감리용역 추진('08.11.20 착공)
 - 사업량 : B=20m, L=620m(교량 170m 포함)
 - 사업비 : 11,137백만원(도급8,877, 관급1,199, 폐기물224, 전기311, 지장물526)

□ 향후 추진

- 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역 지속 추진(13개공구)
- 한남고가차도 건설공사 본격 추진(연중)
- 입체교차시설(지하차도) 및 측면도로, 복합활용공간(녹지) 설치 등을
본선사업과 연계하여 단계별 발주 추진

※ 입체교차시설 / 성남(B=20m, L=482m), 원동(B=25m, L=455m), 판암2(B=14m, L=139m)

전국체전 관련 경기장 확충

- 전국체전의 성공적인 개최 및 경기운영을 대비한 부족경기장 확충
- 지역 주민의 여가활동 공간마련과 향후 생활체육확산 기틀 구축

□ 사업개요

● 한밭종합운동장 리모델링

- 위 치 : 중구 부사동 162-1번지 일원
- 내 용
 - 신 축 : 육상보조경기장, 지하주차장, 체육회관
 - 이 전 : 정구장, 게이트볼장, 씨름장, 정문
 - 보 수 : 주경기장, 충무체육관, 다목적체육관, 시립수영장 등
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 9
- 사 업 비 : 39,800백만원 (기투자 21,439 , '09년 18,361)

● 전국체전 수영장 건립

- 위 치 : 동구 용운동 산12-2번지 외 6필지
- 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 17,515m²
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 8
- 사 업 비 : 28,734백만원 (기투자 26,302, '09년 2,432)

□ 추진상황

- 한밭종합운동장 리모델링 공사 —충무체육관 및 시립수영장, 게이트볼장 공사 완료/ 지하주차장 골조공사, 체육회관 터파기공사 추진/ 주경기장 및 다목적 회관 리모델링 추진 (공정 41%)
- 전국체전수영장 건립공사 —지상4층 철근콘크리트공사 추진 (공정 49.52%)
 - ※ 기계, 전기, 소방, 통신설비 작업추진

□ 향후 추진

- 2009. 8. : 전국체전수영장 건립공사 준공(예정)
- 2009. 9. : 한밭종합운동장 리모델링공사 준공(예정)

대덕테크노밸리 진입로 개설

- 대덕 R&D 특구 활성화 및 컨벤션센터 주변의 원활한 교통소통
- 시민의 자긍심 고취 및 창조적 명품교량 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 탑립동 테크노밸리 남측 ~ 와동 천변고속화도로
- 사 업 량 : L=1.8km, B=25~30m(주교량 L=420m, 램프교 L=310m)
- 사업기간 : 2007. 6. ~ 2010. 7. 19
- 사 업 비 : 60,800백만원(기투자 12,262/ 09투자 42,445/ 이후 6,093)

□ 추진상황

- '08. 1. 29 : 실시설계적격자 선정 및 실시설계착수
- '08. 6. 27 : 도시계획시설사업 실시계획인가(시점부)
- '08. 7. 28 : 공사계약 / 한화건설(주) 외 3개사
- '08. 7. 30 : 공사 착공
- '08. 9. 22 : 현장사무실 건립
- '08. 12. 현재 : 보상 및 하천구역 공사 추진중

□ 향후 추진

- '09. 10. : 주탑부 완료 및 IAC 2009 Daejeon 기간중 야간경관 조명 점등
- '10. 7. 19 : 공사 준공

유등천 좌안도로 건설

- 국도4, 32호선 연결로 태평교 ~ 유등교간 병목현상 해소
- 유등천 수계를 이용한 천변도로 건설로 도심교통체증 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 서구 변동(태평교)~복수동(버드내교)
- 사업량 : L=2.3km, B=20~23m
- 사업기간 : 2005. 5. ~ 2011. 12.
- 사업비 : 52,000백만원(기투자 26,099/ 09투자 7,014/ 이후 18,887)

□ 추진상황

- '07. 11. 8 : 토목 공사 착수 / JA건설(주)
- '08. 6. 11 : 하천점용허가 신청(사전 방문 및 회의 등 10차례 협의)
- '08. 6. 30 : 하천점용허가 완료
- '08. 9. 5 : 호남선 유등철교 횡단구간 위탁시공 협약 및 사업비 납부
/ 한국철도공사
- '08. 12. : 유등교 지하차도 비개착구간(TRCM) 및 집수정 공사중

□ 향후 추진

- '09. 12. : 유등교 지하차도 완료
- '11. 12. : 공사 준공
